SIPCOR®

PRESUPUESTO

FECHA: **16/09/2026**
N° DE PRESUP.: **2835**
OBRA: **VIVIENDA**
CLIENTE: **DIEGO MALDONADO**
PROFESIONAL: **-**
LOCALIDAD: **EZEIZA, BUENOS AIRES**



KitFull

TRABAJAMOS CON

Marcas líderes del mercado

rothoblaas · fischer · LP BUILDING SOLUTIONS · DORKING® CALIDAD DESDE SIEMPRE · Forestal ELDORADO · Quimtex pinturas y revestimientos · PoliPor EPS POLIESTIRENO EXPANDIDO

El **Kit más completo** del mercado

CALIDAD SUPERIOR 16 INSUMOS CALIDAD SUPERIOR + 105 PANELES DIFERENTES + MADERAS 12 DE VINCULACIÓN +



Fábrica
Ruta 11 Km 259
351 7549194
contacto@sipcor.com.ar
Corral de Bustos Ifflinger
Córdoba - Argentina

Casa Central
Av. Santa Fe 888
351 7549194
contacto@sipcor.com.ar
Corral de Bustos Ifflinger
Córdoba - Argentina

Oficinas Comerciales
Córdoba Cap., Córdoba
Buenos Aires Cap., Bs. As.
Posadas, Misiones
Bariloche, Río Negro
Paraná, Entre Ríos
Concordia, Entre Ríos
Rosario, Santa Fe
Pergamino, Bs. As.
Mar del Plata, Bs. As.
Pinamar, Bs. As.
S. M. de los Andes, Neuquén

¿QUE INCLUYE NUESTRO PRESUPUESTO?

Detalle de presupuesto

CALIDAD SUPERIOR 16 INSUMOS CALIDAD SUPERIOR

1. INSUMOS DE INSTALACIÓN



- TORNILLO PHILLIPS NEGRO 8mmx3"



- VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 1/2"



- TUERCA GALVANIZADA DE 1/2"



- ARANDELA GALVANIZADA DE 1/2"



- CLAVOS COIL 2,5"



- TORNILLO TBS 6x16 mm



- TORNILLO TORX HBS 6x160 mm



- GRAMPAS 8 mm




- MEMBRANA ASFÁLTICA AUTOADHESIVA



- MEMBRANA TRANSPIR 110



- FLEXI BAND



- EASY BAND



- ADHESIVO DE POLIURETANO COLAPUR



- PINTURA BASE DE GOMA




- POLIURETANO EXPANDIDO




- ANCLAJE QUÍMICO


+

2. MADERAS DE VINCULACIÓN

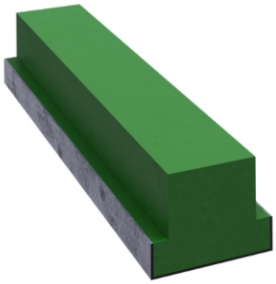


- SOLERA CON Y SIN MEMBRANA AUTOADHESIVA

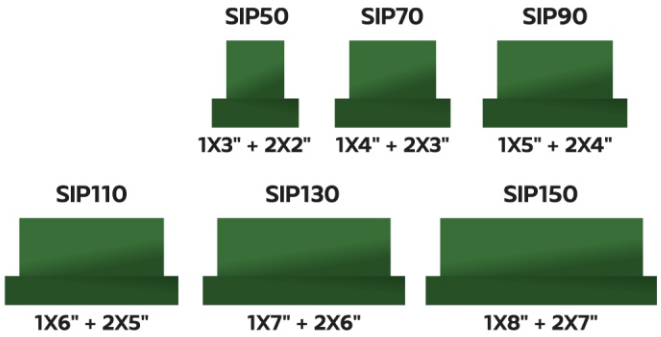

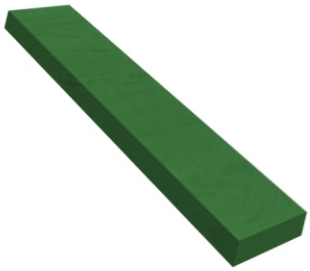


- MADERAS DE PREMARCOS DE ABERTURAS Y CIERRES

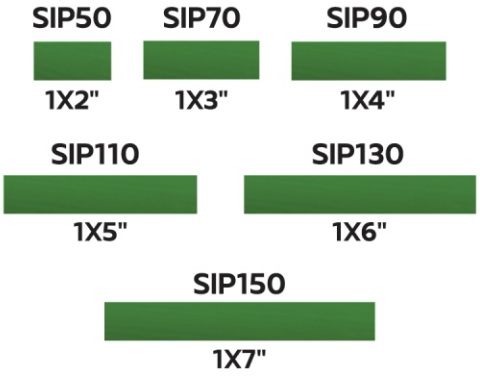



- MADERAS DE VINCULACIÓN ENTRE PANELES Y ESQUINAS

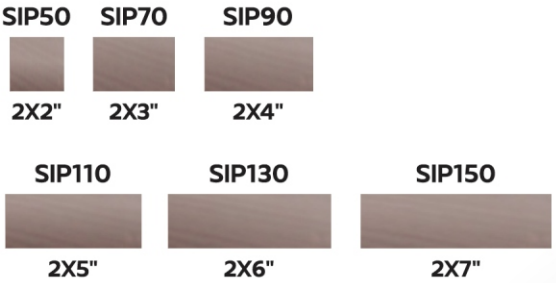

TABLAS DE MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD

1X2" / 1X3" / 1X4" / 1X5" / 1X6" / 1X7" / 2X2" / 2X3" / 2X4" / 2X5" / 2X6" / 2X7"

+

3. PANELES SIP - MUROS, PISOS, ENTREPISOS Y TECHOS



PANEL SIP 50

MURO / PISO / ENTREPISO / TECHO

COMPOSICIÓN	MEDIDAS (m)
OSB 9,5 EPS 50mm D. 10KG OSB 9,5	1,22 X 2,44 X 0,069
OSB 9,5 EPS 50mm D. 15KG OSB 9,5	1,22 X 2,44 X 0,069
OSB 9,5 EPS 50mm D. 20KG OSB 9,5	1,22 X 2,44 X 0,069
OSB 11,1 EPS 50mm D. 10KG OSB 11,1	1,22 X 2,44 X 0,072
OSB 11,1 EPS 50mm D. 15KG OSB 11,1	1,22 X 2,44 X 0,072
OSB 11,1 EPS 50mm D. 20KG OSB 11,1	1,22 X 2,44 X 0,072



PANEL SIP 70

MURO / PISO / ENTREPISO / TECHO

COMPOSICIÓN	MEDIDAS (m)
OSB 9,5 EPS 70mm D. 10KG OSB 9,5	1,22 X 2,44 X 0,089
OSB 9,5 EPS 70mm D. 15KG OSB 9,5	1,22 X 2,44 X 0,089
OSB 9,5 EPS 70mm D. 20KG OSB 9,5	1,22 X 2,44 X 0,089
OSB 11,1 EPS 70mm D. 10KG OSB 11,1	1,22 X 2,44 X 0,092
OSB 11,1 EPS 70mm D. 15KG OSB 11,1	1,22 X 2,44 X 0,092
OSB 11,1 EPS 70mm D. 20KG OSB 11,1	1,22 X 2,44 X 0,092



PANEL SIP 90

MURO / PISO / ENTREPISO / TECHO

COMPOSICIÓN	MEDIDAS (m)
OSB 9,5 EPS 90mm D. 10KG OSB 9,5	1,22 X 2,44 X 0,109
OSB 9,5 EPS 90mm D. 15KG OSB 9,5	1,22 X 2,44 X 0,109
OSB 9,5 EPS 90mm D. 20KG OSB 9,5	1,22 X 2,44 X 0,109
OSB 11,1 EPS 90mm D. 10KG OSB 11,1	1,22 X 2,44 X 0,112
OSB 11,1 EPS 90mm D. 15KG OSB 11,1	1,22 X 2,44 X 0,112
OSB 11,1 EPS 90mm D. 20KG OSB 11,1	1,22 X 2,44 X 0,112



PANEL SIP 110

MURO / PISO / ENTREPISO / TECHO

COMPOSICIÓN	MEDIDAS (m)
OSB 9,5 EPS 110mm D. 10KG OSB 9,5	1,22 X 2,44 X 0,129
OSB 9,5 EPS 110mm D. 15KG OSB 9,5	1,22 X 2,44 X 0,129
OSB 9,5 EPS 110mm D. 20KG OSB 9,5	1,22 X 2,44 X 0,129
OSB 11,1 EPS 110mm D. 10KG OSB 11,1	1,22 X 2,44 X 0,132
OSB 11,1 EPS 110mm D. 15KG OSB 11,1	1,22 X 2,44 X 0,132
OSB 11,1 EPS 110mm D. 20KG OSB 11,1	1,22 X 2,44 X 0,132



PANEL SIP 130

MURO / PISO / ENTREPISO / TECHO

COMPOSICIÓN	MEDIDAS (m)
OSB 9,5 EPS 130mm D. 10KG OSB 9,5	1,22 X 2,44 X 0,149
OSB 9,5 EPS 130mm D. 15KG OSB 9,5	1,22 X 2,44 X 0,149
OSB 9,5 EPS 130mm D. 20KG OSB 9,5	1,22 X 2,44 X 0,149
OSB 11,1 EPS 130mm D. 10KG OSB 11,1	1,22 X 2,44 X 0,152
OSB 11,1 EPS 130mm D. 15KG OSB 11,1	1,22 X 2,44 X 0,152
OSB 11,1 EPS 130mm D. 20KG OSB 11,1	1,22 X 2,44 X 0,152



PANEL SIP 150

MURO / PISO / ENTREPISO / TECHO

COMPOSICIÓN	MEDIDAS (m)
OSB 9,5 EPS 150mm D. 10KG OSB 9,5	1,22 X 2,44 X 0,169
OSB 9,5 EPS 150mm D. 15KG OSB 9,5	1,22 X 2,44 X 0,169
OSB 9,5 EPS 150mm D. 20KG OSB 9,5	1,22 X 2,44 X 0,169
OSB 11,1 EPS 150mm D. 10KG OSB 11,1	1,22 X 2,44 X 0,172
OSB 11,1 EPS 150mm D. 15KG OSB 11,1	1,22 X 2,44 X 0,172
OSB 11,1 EPS 150mm D. 20KG OSB 11,1	1,22 X 2,44 X 0,172



PANEL TECHO MDF RANURADO

PANEL **SIP50**

COMPOSICIÓN	MEDIDAS (m)
MDF 9 EPS 50mm D. 10KG OSB 9,5	0,60 X 2,40 X 0,069
MDF 9 EPS 50mm D. 15KG OSB 9,5	0,60 X 2,40 X 0,069
MDF 9 EPS 50mm D. 20KG OSB 9,5	0,60 X 2,40 X 0,069

PANEL **SIP70**

COMPOSICIÓN	MEDIDAS (m)
MDF 9 EPS 70mm D. 10KG OSB 9,5	0,60 X 2,40 X 0,089
MDF 9 EPS 70mm D. 15KG OSB 9,5	0,60 X 2,40 X 0,089
MDF 9 EPS 70mm D. 20KG OSB 9,5	0,60 X 2,40 X 0,089

PANEL **SIP90**

COMPOSICIÓN	MEDIDAS (m)
MDF 9 EPS 90mm D. 10KG OSB 9,5	0,60 X 2,40 X 0,109
MDF 9 EPS 90mm D. 15KG OSB 9,5	0,60 X 2,40 X 0,109
MDF 9 EPS 90mm D. 20KG OSB 9,5	0,60 X 2,40 X 0,109

PANEL **SIP110**

COMPOSICIÓN	MEDIDAS (m)
MDF 9 EPS 110mm D. 10KG OSB 9,5	0,60 X 2,44 X 0,129
MDF 9 EPS 110mm D. 15KG OSB 9,5	0,60 X 2,44 X 0,129
MDF 9 EPS 110mm D. 20KG OSB 9,5	0,60 X 2,44 X 0,129

PANEL **SIP130**

COMPOSICIÓN	MEDIDAS (m)
MDF 9 EPS 130mm D. 10KG OSB 9,5	0,60 X 2,40 X 0,149
MDF 9 EPS 130mm D. 15KG OSB 9,5	0,60 X 2,40 X 0,149
MDF 9 EPS 130mm D. 20KG OSB 9,5	0,60 X 2,40 X 0,149

PANEL **SIP150**

COMPOSICIÓN	MEDIDAS (m)
MDF 9 EPS 150mm D. 10KG OSB 9,5	0,60 X 2,40 X 0,169
MDF 9 EPS 150mm D. 15KG OSB 9,5	0,60 X 2,40 X 0,169
MDF 9 EPS 150mm D. 20KG OSB 9,5	0,60 X 2,40 X 0,169



PANEL TECHO FENÓLICO DE PINO RANURADO

PANEL **SIP50**

COMPOSICIÓN	MEDIDAS (m)
FDP 9 EPS 50mm D. 10KG OSB 9,5	1,22 X 2,44 X 0,069
FDP 9 EPS 50mm D. 15KG OSB 9,5	1,22 X 2,44 X 0,069
FDP 9 EPS 50mm D. 20KG OSB 9,5	1,22 X 2,44 X 0,069

PANEL **SIP70**

COMPOSICIÓN	MEDIDAS (m)
FDP 9 EPS 70mm D. 10KG OSB 9,5	1,22 X 2,44 X 0,089
FDP 9 EPS 70mm D. 15KG OSB 9,5	1,22 X 2,44 X 0,089
FDP 9 EPS 70mm D. 20KG OSB 9,5	1,22 X 2,44 X 0,089

PANEL **SIP90**

COMPOSICIÓN	MEDIDAS (m)
FDP 9 EPS 90mm D. 10KG OSB 9,5	1,22 X 2,44 X 0,109
FDP 9 EPS 90mm D. 15KG OSB 9,5	1,22 X 2,44 X 0,109
FDP 9 EPS 90mm D. 20KG OSB 9,5	1,22 X 2,44 X 0,109

PANEL **SIP110**

COMPOSICIÓN	MEDIDAS (m)
FDP 9 EPS 110mm D. 10KG OSB 9,5	1,22 X 2,44 X 0,129
FDP 9 EPS 110mm D. 15KG OSB 9,5	1,22 X 2,44 X 0,129
FDP 9 EPS 110mm D. 20KG OSB 9,5	1,22 X 2,44 X 0,129

PANEL **SIP130**

COMPOSICIÓN	MEDIDAS (m)
FDP 9 EPS 130mm D. 10KG OSB 9,5	1,22 X 2,44 X 0,149
FDP 9 EPS 130mm D. 15KG OSB 9,5	1,22 X 2,44 X 0,149
FDP 9 EPS 130mm D. 20KG OSB 9,5	1,22 X 2,44 X 0,149

PANEL **SIP150**

COMPOSICIÓN	MEDIDAS (m)
FDP 9 EPS 150mm D. 10KG OSB 9,5	1,22 X 2,44 X 0,169
FDP 9 EPS 150mm D. 15KG OSB 9,5	1,22 X 2,44 X 0,169
FDP 9 EPS 150mm D. 20KG OSB 9,5	1,22 X 2,44 X 0,169



PANEL TECHO MELAMINA COLOR RANURADO

1-Roble Whiteriver beige arena
2-Pino Cascina
3-Roble Nebraska gris

PANEL **SIP50**

COMPOSICIÓN	MEDIDAS (m)
MC 5,5 EPS 50mm D. 10KG OSB 9,5	0,60 X 2,40 X 0,065
MC 5,5 EPS 50mm D. 15KG OSB 9,5	0,60 X 2,40 X 0,065
MC 5,5 EPS 50mm D. 20KG OSB 9,5	0,60 X 2,40 X 0,065

PANEL **SIP70**

COMPOSICIÓN	MEDIDAS (m)
MC 5,5 EPS 70mm D. 10KG OSB 9,5	0,60 X 2,40 X 0,085
MC 5,5 EPS 70mm D. 15KG OSB 9,5	0,60 X 2,40 X 0,085
MC 5,5 EPS 70mm D. 20KG OSB 9,5	0,60 X 2,40 X 0,085

PANEL **SIP90**

COMPOSICIÓN	MEDIDAS (m)
MC 5,5 EPS 90mm D. 10KG OSB 9,5	0,60 X 2,40 X 0,105
MC 5,5 EPS 90mm D. 15KG OSB 9,5	0,60 X 2,40 X 0,105
MC 5,5 EPS 90mm D. 20KG OSB 9,5	0,60 X 2,40 X 0,105

PANEL **SIP110**

COMPOSICIÓN	MEDIDAS (m)
MC 5,5 EPS 110mm D. 10KG OSB 9,5	0,60 X 2,40 X 0,125
MC 5,5 EPS 110mm D. 15KG OSB 9,5	0,60 X 2,40 X 0,125
MC 5,5 EPS 110mm D. 20KG OSB 9,5	0,60 X 2,40 X 0,125

PANEL **SIP130**

COMPOSICIÓN	MEDIDAS (m)
MC 5,5 EPS 130mm D. 10KG OSB 9,5	0,60 X 2,40 X 0,145
MC 5,5 EPS 130mm D. 15KG OSB 9,5	0,60 X 2,40 X 0,145
MC 5,5 EPS 130mm D. 20KG OSB 9,5	0,60 X 2,40 X 0,145


PANEL **SIP150**

COMPOSICIÓN	MEDIDAS (m)
MC 5,5 EPS 150mm D. 10KG OSB 9,5	0,60 X 2,40 X 0,165
MC 5,5 EPS 150mm D. 15KG OSB 9,5	0,60 X 2,40 X 0,165
MC 5,5 EPS 150mm D. 20KG OSB 9,5	0,60 X 2,40 X 0,165

4 - MANUAL DE INSTALACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO

Contamos con un departamento técnico especializado para realizar todo tipo de proyecto a medida, entregando un manual de instalación con todo el detalle técnico, para su ejecución.

Brindamos soporte profesional antes, durante y post ejecución de cada obra.

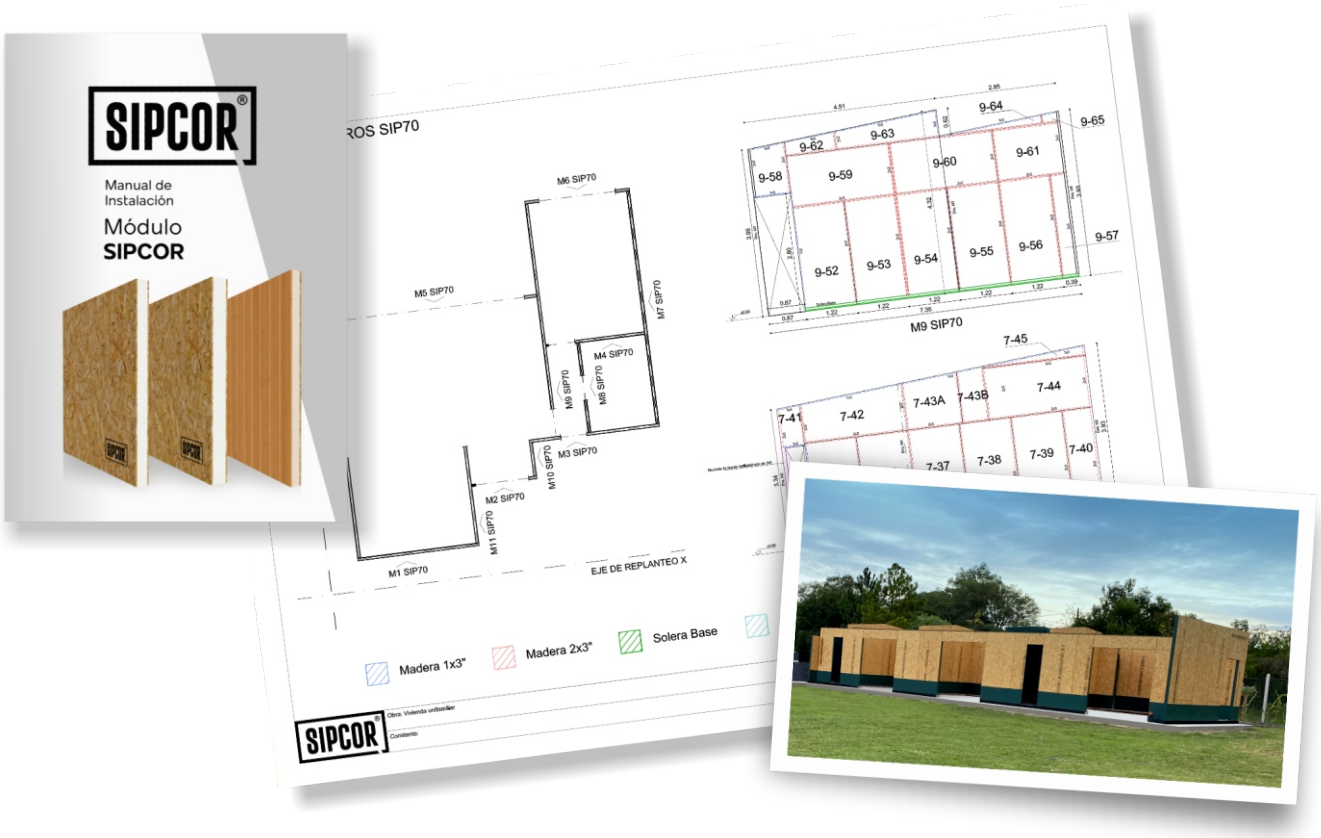

En caso de resoluciones técnicas complejas se solicitará soporte de un ingeniero, el mismo puede ser brindado por el cliente o les pasaremos contactos. El costo de este trabajo es aparte.


5 - GUÍA DE INSTALACIÓN


Entrega en formato físico donde encontrará la información técnica completa, actualizada y organizada para garantizar un proceso de montaje preciso y seguro.



DETALLE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTADA

Observaciones:
El presupuesto fue realizado según información brindada por el cliente.

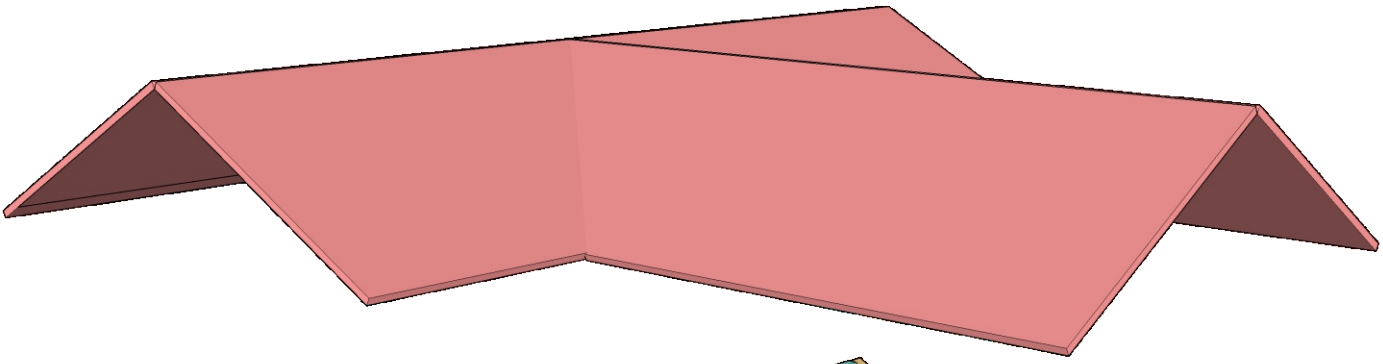

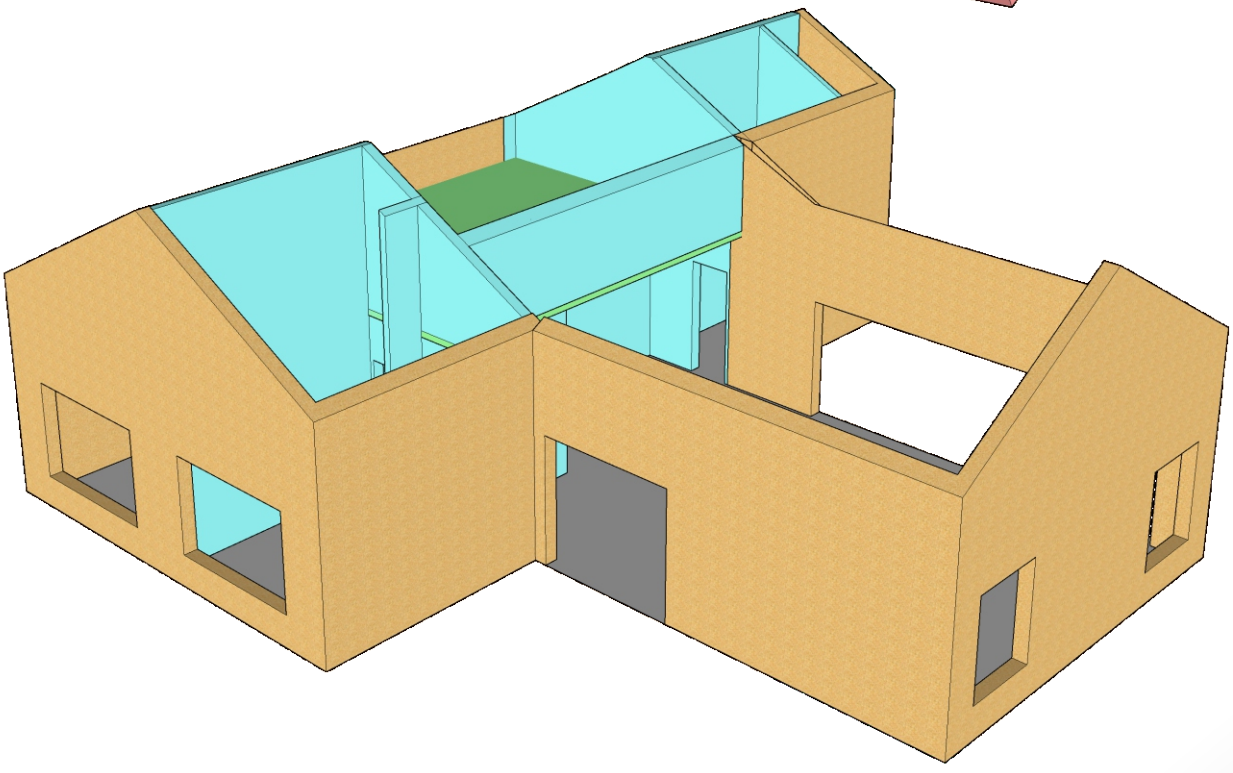

SUPERFICIE DE OBRA:
Cubierta: **140,30 m2**
Semicubierta: **23,70m2**
Total: **164,00 m2**

PISO | MURO INTERIOR | ENTREPISO | TECHO | PANEL INTERIOR DURLOCK | MURO EXTERIOR | OTROS



IMPORTANTE

LA PRESENTE COTIZACIÓN CONSTITUYE UN PRESUPUESTO INICIAL, ELABORADO EN BASE A LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA. LA CANTIDAD DE PANELES PODRÁ SUFRIR VARIACIONES, TANTO EN AUMENTO COMO EN DISMINUCIÓN, DE ACUERDO CON LA COTIZACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO.

Las posibles situaciones que pueden generar ajustes en la cantidad de paneles son:

- **Modificaciones en el proyecto enviado por el cliente.**
  (Ej: alturas de muros, aberturas, agregado de muros, tipo de panel a utilizar, etc.)

- **Falta de modulación del proyecto según las dimensiones estándares de los paneles.**
  (Ocasionando desperdicios de corte)

- **Información brindada insuficiente o incompleta al momento de elaborar el presente presupuesto.**
  (Ej: falta de medidas en alturas, aberturas, muros, pisos, etc.)

DE EXISTIR UNA VARIACIÓN SERÁ COMUNICADA AL FINALIZAR EL PROCESO DE LOS MANUALES TÉCNICOS DEL PROYECTO.
(Manual de corte y manual de instalación)

UBIC.	DESCRIPCIÓN	CANT. (Unidad)	PRECIO USD (unidad)	TOTAL
MURO	**Muro SIP70 Exterior – Kit autoportante con insumos.** **Medidas:** 1,22 x 2,44 x 0,092m. **OSB:** 11,1mm. **EPS:** 70mm – Densidad 15kg/m3 **INSUMOS (13):** Tuerca 1/2", Arandela Plana 1/2", Anclaje Químico, Membrana Líquida, Membrana Asfáltica, Membrana Hidrófuga, Flexi Band, Espuma de Poliuretano, Clavos Coil 2 1/2", Tornillo Fix 3x8", Grampa 3/8", Varilla roscada 1/2", Cola Pur. **MADERAS:** 1x4", 1x3", 2x3" y 2x2".	64	USD 191,97	USD 12286,08
MURO	**Muro SIP70 Interior – Kit autoportante con insumos.** **Medidas:** 1,22 x 2,44 x 0,092m. **OSB:** 11,1mm. **EPS:** 70mm. Densidad 15kg/m3 **INSUMOS (9):** Tuerca 1/2", Arandela Plana 1/2", Anclaje Químico, Membrana Líquida, Membrana Asfáltica, Espuma de Poliuretano, Clavos Coil 2 1/2", Varilla roscada 1/2", Cola Pur. **MADERAS:** 1x4", 1x3" y 2x3".	56	USD 173,86	USD 9736,16

ESQUINA	**Esquina SIP70 – Con insumos.** **Medidas:** 2,44ml. **INSUMOS (2):** Tornillos HSB6x160, Colapur. **MADERA:** 2x3".	46	USD	14,91	USD	685,86
ENTREPISO	**Entrepiso SIP70 - Con insumos.** **Medidas:** 1,22 x 2,44 x 0,092m. **OSB:** 11,1mm. **EPS:** 70mm. Densidad 15kg/m3 **INSUMOS (3):** Espuma de Poliuretano, Clavos Coil 2 1/2" y tornillos según estructura. **MADERAS:** Vinculación y perimetral de 2x3".	13	USD	149,45	USD	1942,85
TECHO	**Techo SIP50 Ranurado MDF – Con** **Medidas:** 0,60 x 2,40 x 0,0685m. **OSB:** 9,5mm. **Terminación MDF:** 9mm. **EPS:** 50mm. Densidad 15kg/m3 **INSUMOS (5):** Membrana Hidrófuga, Easy Band, Espuma de Poliuretano, Grampas 3/8", Tornillos TBS 6x140.	137	USD	67,15	USD	9199,55

SUBTOTAL		USD	33850,50
IVA 21%		USD	7108,61
TOTAL		**USD**	**40959,11**
Tipo de Cam.	15/9/2026	USD	$ 1.530,00
TOTAL PESOS ARG.		$	62.667.430,65

Fábrica
Ruta 11 Km 259
351 7549194
contacto@sipcor.com.ar
Corral de Bustos Ifflinger
Córdoba - Argentina

Casa Central
Av. Santa Fe 888
351 7549194
contacto@sipcor.com.ar
Corral de Bustos Ifflinger
Córdoba - Argentina

Oficinas Comerciales
Córdoba Cap., Córdoba
Buenos Aires Cap., Bs. As.
Posadas, Misiones
Bariloche, Río Negro
Paraná, Entre Ríos
Concordia, Entre Ríos
Rosario, Santa Fe
Pergamino, Bs. As.
Mar del Plata, Bs. As.
Pinamar, Bs. As.
S. M. de los Andes, Neuquén

El presupuesto esta expresado en dolares oficiales tipo venta, al tipo de cambio del BNA del cierre del dia anterior.

Los materiales se entregaran sobre el camion en la plata de Corral de Bustos, Cordoba.

El flete no esta incluido.

Los tirantes de techos, vigas y dinteles que figuran en el manual de instalacion, NO estan incluidos.

Validez del presupuesto: 5 dias desde la fecha emitida, con ajuste dólar oficial BNA.

Condiciones de pago: A convenir.

Plazo de entrega: A convenir.

bancor BANCO DE CÓRDOBA	Cuenta: **CC $ 333 0002697408** Cuit/Cuil: **33718059149** Nombre y Apellido: **PANELES SIP CORDOBA S.A.S.** CBU: **0200333501000002697483** Alias CBU: **SIPCOR.PANELES**
Banco Nación	Cuenta: **CC $ 16272200072186** Cuit/Cuil: **33718059149** Nombre y Apellido: **PANELES SIP CORDOBA S.A.S.** CBU: **0110220020022000721864** Alias CBU: **PANELES.SIPCOR**

Para acreditar el pago recibido por este medio, es necesario enviar el comprobante de la operación al **vendedor correspondiente 3468-513162** o por email **administracion@sipcor.com.ar**

SIPCOR®

"El Kit más completo, de mejor calidad y precio del mercado."

CALIDAD SUPERIOR 16 INSUMOS CALIDAD SUPERIOR

LP OSB APA ESTRUTURAL CONTRA CUPINS

ASTM INTERNATIONAL Helping our world work better

Fábrica
Ruta 11 Km 259
351 7549194
contacto@sipcor.com.ar
Corral de Bustos Ifflinger
Córdoba - Argentina

Casa Central
Av. Santa Fe 888
351 7549194
contacto@sipcor.com.ar
Corral de Bustos Ifflinger
Córdoba - Argentina

Oficinas Comerciales
Córdoba Cap., Córdoba
Buenos Aires Cap., Bs. As.
Posadas, Misiones
Bariloche, Río Negro
Paraná, Entre Ríos
Concordia, Entre Ríos
Rosario, Santa Fe
Pergamino, Bs. As.
Mar del Plata, Bs. As.
Pinamar, Bs. As.
S. M. de los Andes, Neuquén

www.**sipcor**.com.ar
